最 終 号

令和 2年 2月吉日

一般国道13号 泉田道路 IZUMITA ROAD

お世話になりました！

西山中地区道路工事だより

立春の候、皆様におかれましてはますますご清福にお過ごしのこととお喜び申し上げます。
さて、西山中地区道路改良工事に於いて、昨年５月より９ヵ月間に亘り施工してまいりましたが、無事に施工を完了することができました。今冬は1月でも雪が降らず天候にも恵まれ盛土工事が順調に完了しましたが、こうして無事故無災害にて施工できましたのも、近隣住民の皆様のご理解・ご協力の賜物だと思います。
工事完成をご報告すると共に、地元の皆様に心から感謝申し上げます。

✚ 永井建設 津藤、佐藤、浅岡

★ 現場の着工前写真と完成写真

今までありがとうございました！

平成30～31年度　西山中地区道路改良工事　施工延長L=443.0m

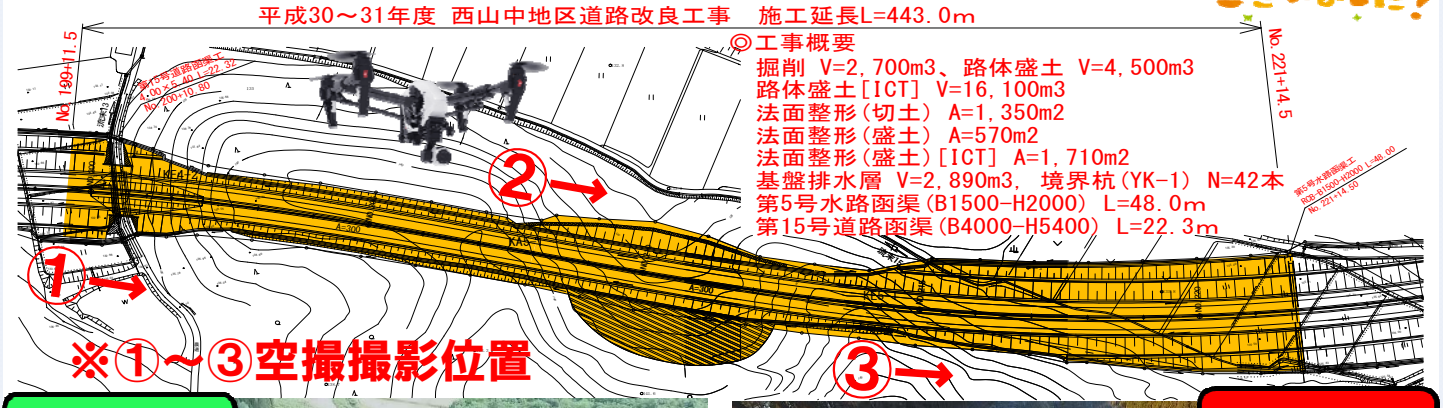

◎工事概要
掘削　V=2,700m3、路体盛土　V=4,500m3
路体盛土[ICT]　V=16,100m3
法面整形(切土)　A=1,350m2
法面整形(盛土)　A=570m2
法面整形(盛土)[ICT]　A=1,710m2
基盤排水層　V=2,890m3,　境界杭(YK-1)　N=42本
第5号水路函渠(B1500-H2000)　L=48.0m
第15号道路函渠(B4000-H5400)　L=22.3m

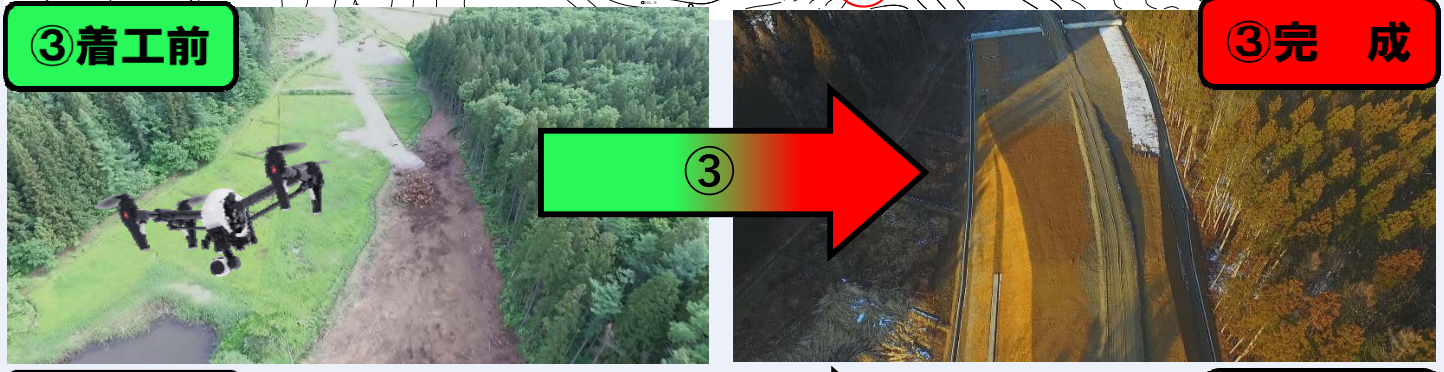

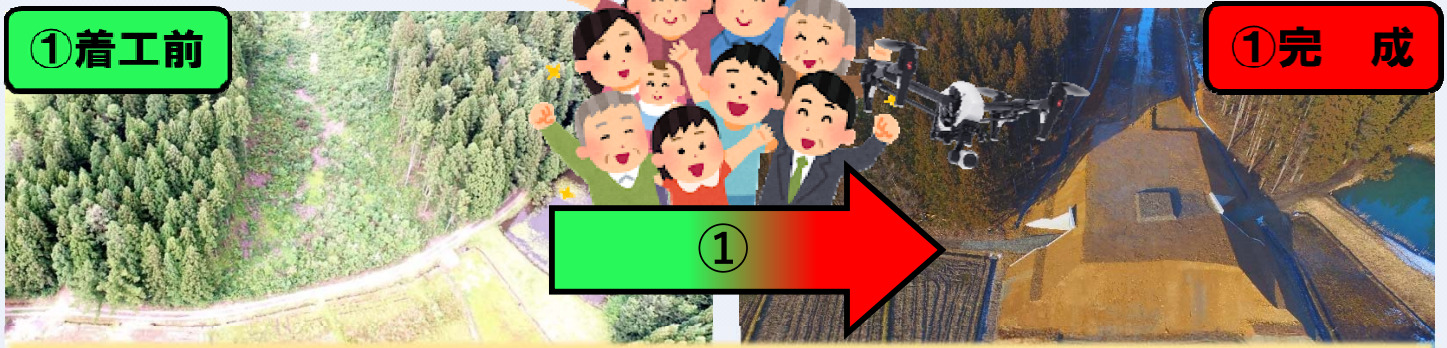

発行・編集　永井建設㈱　西山中道路現場事務所　TEL 0233-29-5523　担当：津藤、佐藤

さらに詳しい内容を知りたい方は会社ホームページまで

会社ホームページ　http://www.nagai-construction.com/

永井建設ウェブ
